

宁镇路一期改建工程今年年底竣工 环城南路快速化改造东段明年9月完工 机场快速路南延工程明年年底完工……

一大批民生项目排出建设时间表

“宁镇路一期改建工程计划于今年年底竣工”“环城南路快速化改造东段明年9月完工”“三官堂大桥及接线工程已启动北岸主墩桩基施工,明年12月主桥合龙”……昨天,市住建委发布一批民生工程的最新建设进展情况,这些市民关心的民生项目明确了任务书和时间表。

环城北路改建工程


9月底完成南北两侧拓宽道路施工

环城北路(姚江大桥至人民路)改建工程,西起姚江大桥(大闸路口西),东至人民路,全长约2001.6米。

“由于现状道路市政基础设施老化,交通拥堵严重,交通组织混乱,通行能力低下,该工程的建设对提高中心城东西向道路综合承载能力,改善交通通行条件,促进城市更新改造具有重要意义。”市住建委相关负责人表示。

截至目前,该工程已经完成环城北路现场清扫、整理,绿化、临时路灯迁移安装及现场障碍物调查,管线迁改方案也已基本确定。施工现场围挡共完成900米,大闸路至下江路道路北侧拓宽段机动车道清表及塘渣便道填筑基本完成。

根据市住建委昨天提供的建设“时间表”,该工程计划在今年4月底前完成第一阶段交通导改范围内的绿化及路灯等设施迁移、保通道路硬化等;6月底前完成北侧拓宽部分新建管线施工;9月底前完成南北两侧拓宽道路施工。

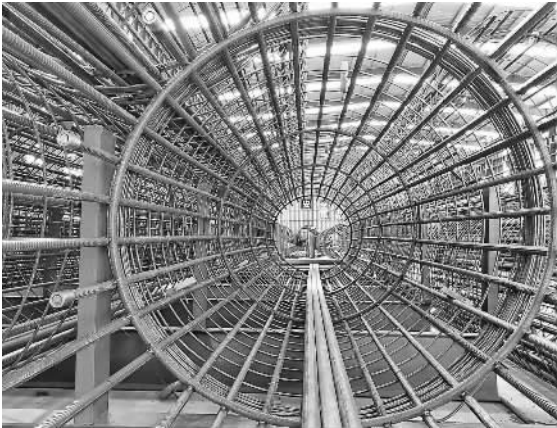

机场快速路南延工程施工现场。 市住建委供图

机场快速路南延工程

明年年底完工

与宁波至奉化城际铁路同步竣工运行

机场快速路南延工程是奉化区连接市中心区的重要快速通道,位于海曙区、鄞州区和奉化区,北起海曙区鄞州大道,南至奉化区岳林东路。该工程对促进奉化区加快融入宁波中心城区、支撑城市空间拓展和经济社会发展具有重大意义。

工程全长约18.8公里,采用“主线高架+地面辅道”的建设形式。其中鄞州区明州大道至奉化区中山东路(约11.8公里)与轨道宁奉城际线“四站五区间”共线,共线段采用高架一体化结构。主线高架采用城市快速路标准建设,地面辅道采用城市主干道标准建设。

去年9月,该项目进入全面施工阶段,目前主线桥桩共有4081枚,累计已完成2341枚,约占总数的57.4%。东江大桥完成主线老桥拆除,县江大桥正在进行新建人非桥施工。

今年计划完成全部桩基工程,并完成轨道车站(方桥站、竹产业园站、蒋家站、大成站)主体结构施工。2019年6月,基本完成高架主体结构,整体项目拟于2019年年底完工,与宁波至奉化城际铁路同步竣工运行。

宁镇路一期改建工程 今年12月竣工 三官堂大桥 明年12月主桥合龙

宁镇路(常洪隧道至金河路)一期改建工程西起常洪隧道,东至镇海区金河路。工程全长约6.6公里。该工程已于2016年7月1日开工,计划竣工时间是今年12月18日。“截至今年2月,该工程的Ⅰ标段已累计完成44%;Ⅱ标段已累计完成62%。”市住建委相关负责人表示。

昨天,记者从市住建委的建设“时间表”上看到,从今年3月至12月每个月的建设任务中都有安排:例如3月完成北侧辅道沥青摊铺,进行交通导改并开始南侧道路施工;4月开始南侧雨污水管道,景观绿化进场施工;5月完成南侧桥梁桩基施工;6月完成南侧雨污水管道施工;9月底实现主车道通车……至12月完成景观绿化在内的项目建设。

同时,市民关心的三官堂大桥及接线工程也传来最新进展,目前已完成北岸主墩涉中石化三官堂油库的房屋拆除工作,同时主桥完成(除北岸主墩外)全部桥梁桩基及南岸承台、墩柱等下部结构施工,启动北岸主墩桩基施工;今年9月,计划完成主桥北岸主墩施工,计划在2019年12月完成主桥合龙。

该项目的建设对于完善路网结构,缓解跨江交通瓶颈,支撑城市空间拓展,推动促进甬江两岸联动发展具有重要意义。

环城南路快速化改造东段 明年9月完工 北环东路 明年10月完工

中兴路(江南路至兴宁路)综合整治工程位于鄞州区,道路与轨道交通3号线一期共线。工程建设范围北起江南路,南至兴宁路,道路全长约4000米。据介绍,该工程主要建设内容包括市政公用设施功能完善、公共空间品质提升和公共街道环境靓化等。同时,结合轨道交通路面恢复,改造城市道路设施,计划今年8月开工建设,2019年12月建成。

兴宁路(兴宁桥至福明路)综合整治工程位于鄞州区,道路与轨道交通4号线兴宁桥至福明路段共线。工程建设范围西起兴宁桥,东至福明路,道路全长约3600米。工程主要建设内容包括市政公用设施功能完善、公共空间品质提升和公共街道环境靓化等。目前已完成项目立项及工可方案初稿,正在开展道路及景观方案设计工作,计划2019年10月开工建设,2020年与轨道4号线开通时同步建成。

此外,市民关心的“三路一桥”也有了最新的完工“时间表”:环城南路快速化改造东段计划于2019年9月完工;北环东路计划于2019年10月完工;东外环路快速化改造工程计划在2019年12月完工;中兴大桥及接线(江南路至青云路)工程,计划于2020年5月完工。

广德湖路匝道及地面辅道工程 今年年底基本完成

广德湖路(环城南路至董山西路)匝道及地面辅道工程,包括环城南路立交西南、东南落地匝道,广德湖路跨线桥的右转匝道,广德湖路地面辅道及道路附属设施。

其中东南匝道全长约617米,含桥梁长约518米;西南匝道全长约676米,含桥梁长约469米;广德湖路跨线桥的右转A匝道,全长约72米,含桥梁长约72米;广德湖路地面辅道全长约720米,包括4座地面桥;同时,还包括立交匝道施工影响范围内杭甬高速公路路基同步拓宽、市政管网、道路附属设施等。

该工程已于2016年1月开工建设。“目前,西侧匝道桩基完成94%,电缆管道基本完工,河道开挖全部完成,雨水管道完成70%。计划今年二季度完成高速公路施工审批手续,三季度完成高压电力等综合管线迁改,年底完成工程量的50%。”市住建委相关负责人表示,“整个工程将于今年年底基本完成。”

据介绍,广德湖路(环城南路至董山西路)匝道及地面辅道工程的建设,将完善鄞州区主干道路与快速路的衔接,交通出行更为便捷。

记者 周科娜 通讯员 廖鑫
